


Baustellenmeldung Geissburgweg Willisau**Stand 09.01.2025****Beschreibung der Baumassnahme:**

- **Erweiterung vom Fernwärmenetz ab der Bushaltestelle Geissburg bis zu den Liegenschaften Geissburgweg 5 und Geissburghalde 1**

Wer	Bauherr: Wärmeverbund Willisau AG Chilegass 15 6130 Willisau	Planer: Amstutz Holzenergie AG Neuhasli 2 6032 Emmen	Ausführende Bauunternehmung: Emil Peyer AG Rossgassmoos 1 6130 Willisau	
	Ort	Gemeinde: Strasse: Bereich:	Willisau Geissburgstrasse und Geissburgweg Bushaltestelle Geissburg – Trottoir bei Geissburgstrasse 13 - Geissburgweg 1 bis 5 – Geissburgstrasse 12– Geissburghalde 1	
Mitteilung	Grund:	<p>Bau von erdverlegten Fernwärmeleitungen. Grab- und Verlegearbeiten in der Geissburgstrasse und im Geissburgweg.</p> <p>Bauphase 1: Einstreifige Verkehrsführung auf der Geissburgstrasse, zwischen Geissburgstrasse 12 und Geissburgring 4. Einsatz einer Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung. Dauer ca. 3 Wochen</p> <p>Bauphase 2: Sperrung Durchfahrt Geissburgweg für Fahrzeuge ab der Einmündung Geissburgstrasse bis zur Liegenschaft Geissburgweg 1. Dauer ca. 3 Wochen. Ein Durchgang 1.2m breit bleibt offen. Ersatzparkplätze für betroffene Anwohner auf dem Parkplatz Schlossfeld.</p> <p>Bauphase 3: Sperrung Durchfahrt Geissburgweg für Fahrzeuge ab der Einmündung Geissburgstrasse bis zur Liegenschaft Geissburgweg 1. Dauer ca. 3 Wochen. Ein Durchgang 1.2m breit bleibt offen. Ersatzparkplätze für betroffene Anwohner auf dem Parkplatz Schlossfeld.</p> <p>Bauphase 4: Hausanschluss Geissburghalde 1 mit Stahlplatten für die Zufahrt zur Geissburgstrasse 12 und 12a. Dauer ca. 2 Wochen</p>		
	Vorgesehene Dauer:	10.02.2025 bis ca. 09.05.2025		
	Planer Projektleitung:	Amstutz Holzenergie AG Tobias Jurt	☎079 637 95 38	
	Bauunternehmung: Bauführung: Polier:	Emil Peyer AG Reto Egli Michael Büchler	☎041 972 62 48 ☎079 926 76 86	
Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Das Trottoir bei Geissburgstrasse 13 wird während der Bauphase 1 gesperrt. Fussgänger können das talseitige Trottoir benutzen - Die Zufahrten zu den Liegenschaften bleiben erhalten, mit kurzen Umwegen für Fahrzeuglenker während Bauphase 2 und 3 			

Bauphasenplan Erweiterung Fernwärme Geissburgweg

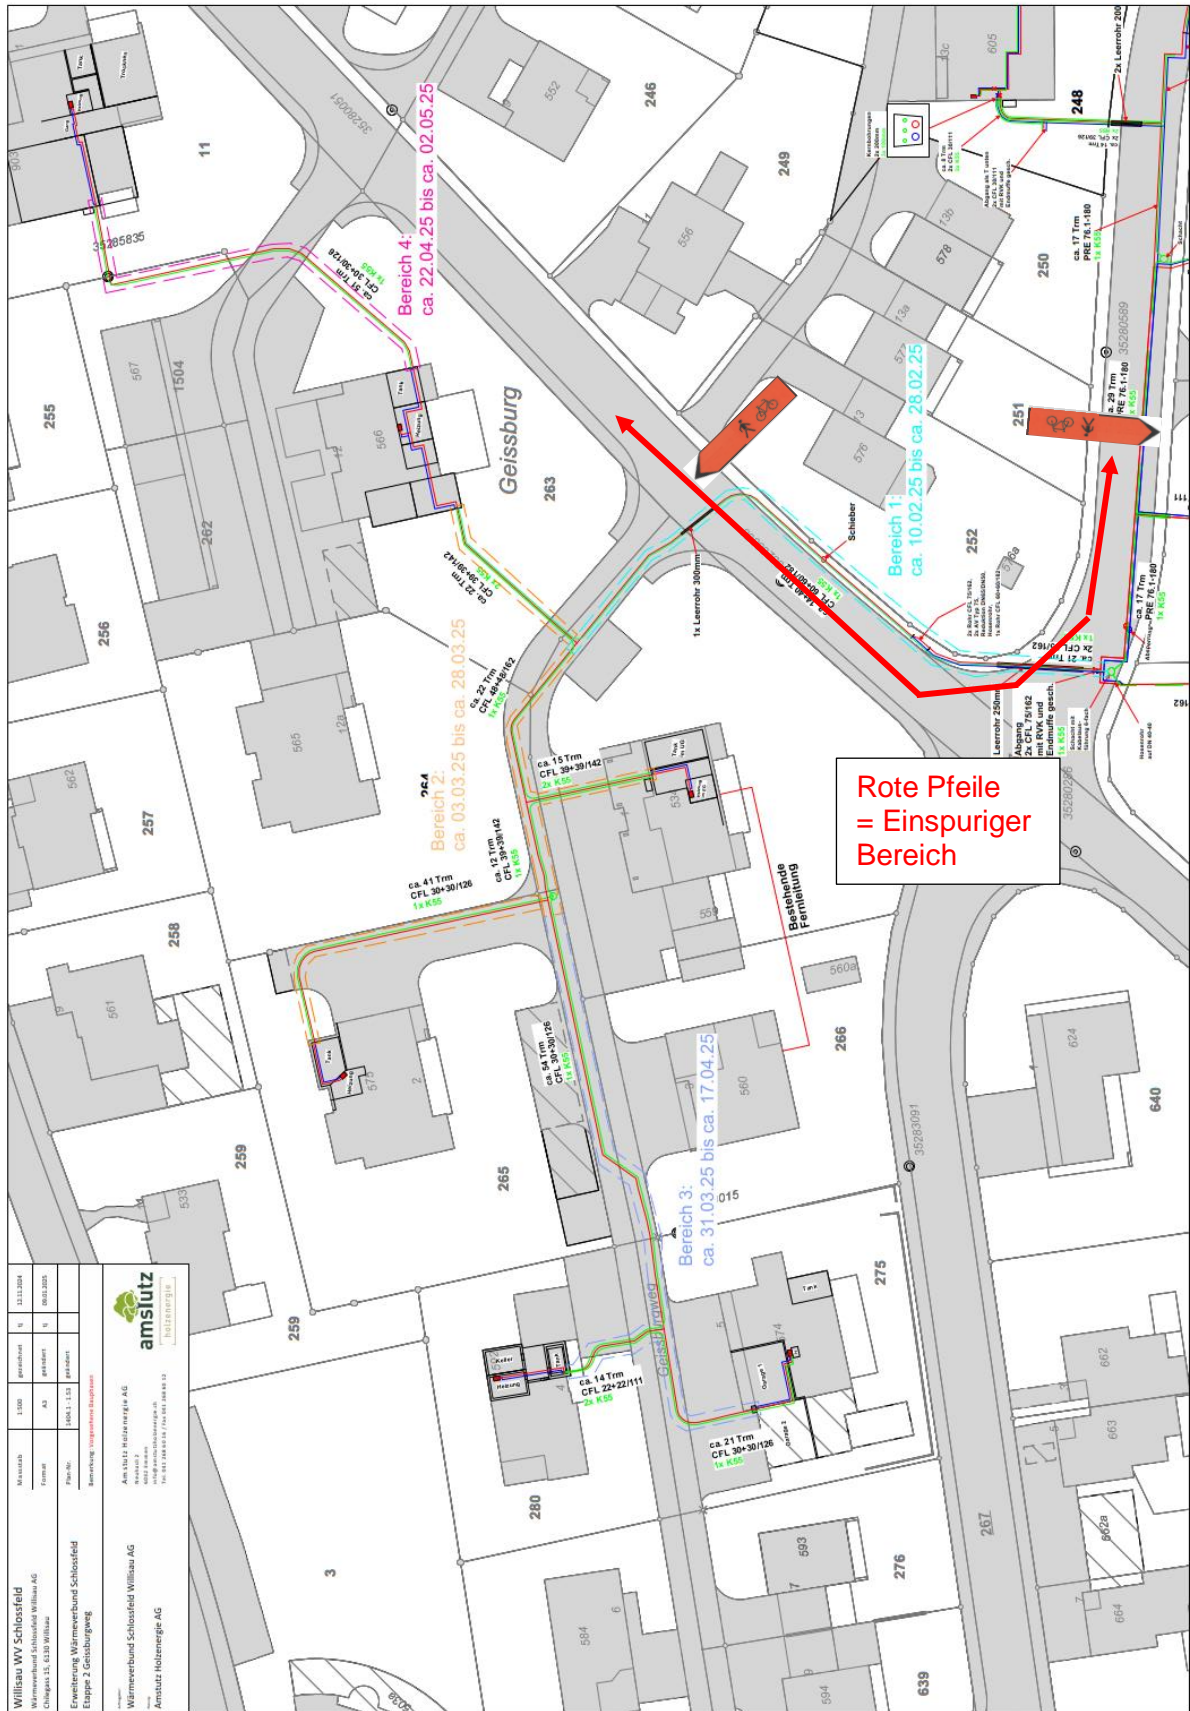


Willtau WV Schlossfeld		Merkmal		L100		gerichtet		N		11.11.2024	
Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG		Form		A3		gerichtet		N		08.03.2025	
Chugplatz 15, 6130 Willtau		Plan-Nr.		100.1.133		gerichtet		N			
Erweiterung Wärmeverbund Schlossfeld		Bezeichnung		Bauphasenplan		Bauphasenplan		Bauphasenplan		Bauphasenplan	
Etappe 2 Geländegang		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG	
		Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG		Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG		Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG		Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG		Wärmeverbund Schlossfeld Willtau AG	
		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG	
		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG		Anstalt Holzenergie AG	

Baubereich 1 mit Lichtsignalanlage:

Luftbild Baubereich 1:



Baubereich 2 und Luftbild:

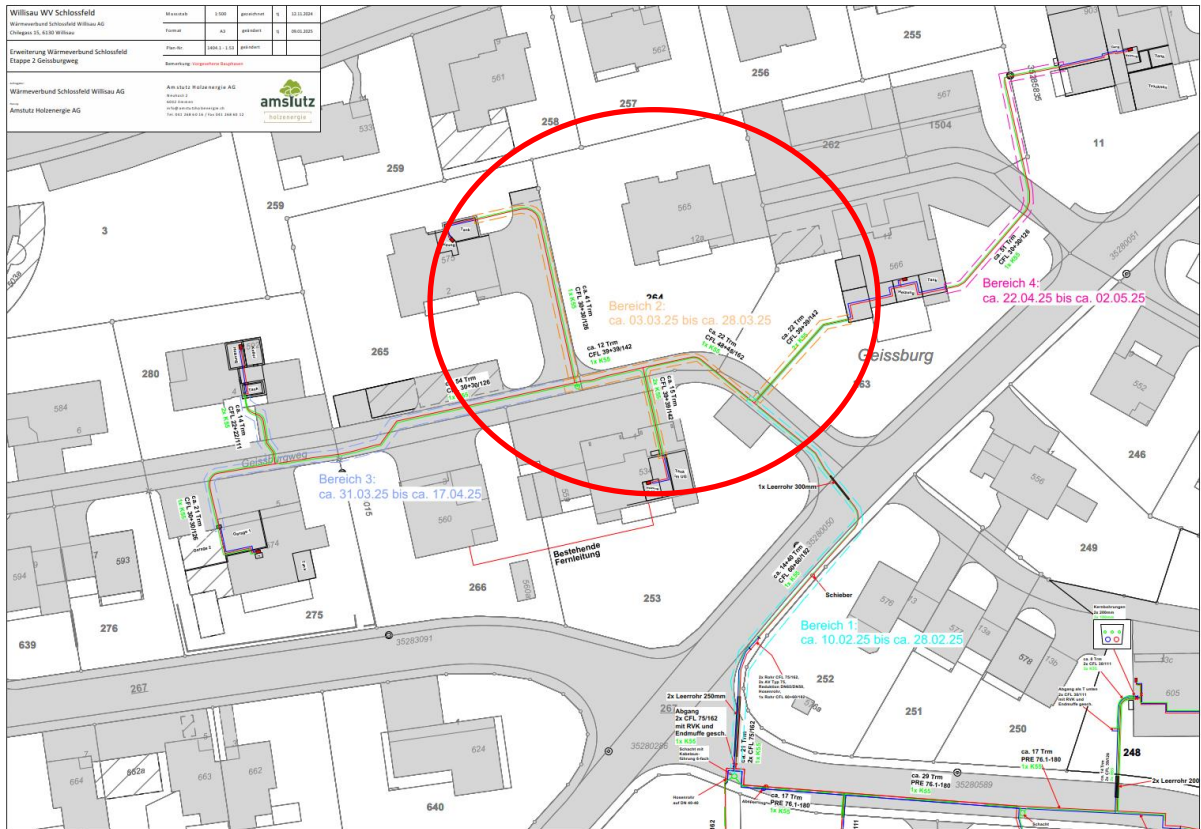

Baubereich 3 und Luftbild:

